

CENTRO TLC NAZIONALE VVF

Monte Cavo COTIE

Sito ponte radio Esercito Italiano

SRTDL Interconnessione nazionale NODO **102**

Lat 41.75639 long 12.70810 altezza 950mt circa

Numero telefonico 0680995331



Armadio n°1 da destra



SEZIONE	RSSI	FREQUENZE
M. Argentario <u>dorsale</u> Portale	(- 82 dbm)	Tx 444.650 Rx 434.650
M. Argentario <u>dorsale</u> Traliccio	(- 88 dbm)	
Canale 90 <u>circolare</u>	(- dbm)	Tx 74.350 Rx 73.550
Nodo <u>link</u>		Tx 434.9250 Rx 444.7875
Cavo Snam 802	(-67 dbm)	
Cavo Snam 402	(-42 dbm)	
Campo Catino 702	(-84 dbm)	
Monte Midia 517	(-79 dbm)	
Monte Terminillo 202	(-82 dbm)	



ANTENNA 1 DORSALE Argentario SCORTA

Nuovo impianto 1 direttiva Rack Antenna direttiva ARC – R-Y611NQ
6 elementi 400Mhz, nuovo cavo ecoflex 60 mt (non in uso lasciata
come scorta) su traliccio RNI altezza da terra 20 circa mt (vedi piantina).



ANTENNA 2 DORSALE Argentario ATTIVA

installata su traliccio portale altezza 15 mt

Nuovo impianto 1 direttiva Rack Antenna direttiva ARC – R-Y611NQ
6 elementi 400Mhz (IN USO), altezza da terra 10 mt circa Lunghezza cavo
ecoflex 35 mt circa (vedi piantina).



ANTENNE LINK

Nuovo impianto 2 Rack Antenna direttiva ARC – R-Y611NQ

6 elementi 400Mhz con nuovo accoppiatore, altezza da terra 42 mt circa Lunghezza cavo ecoflex 85 mt circa (vedi piantina).




Antenne Link posizionamento
visto da sotto

ANTENNA CIRCOLARE

Nuovo impianto 1 Antenna OMNI-DIREZIONALE (lasciata quella esistente in buone condizioni) altezza da terra 38 mt circa

Lunghezza cavo ecoflex 80 mt circa (vedi piantina).




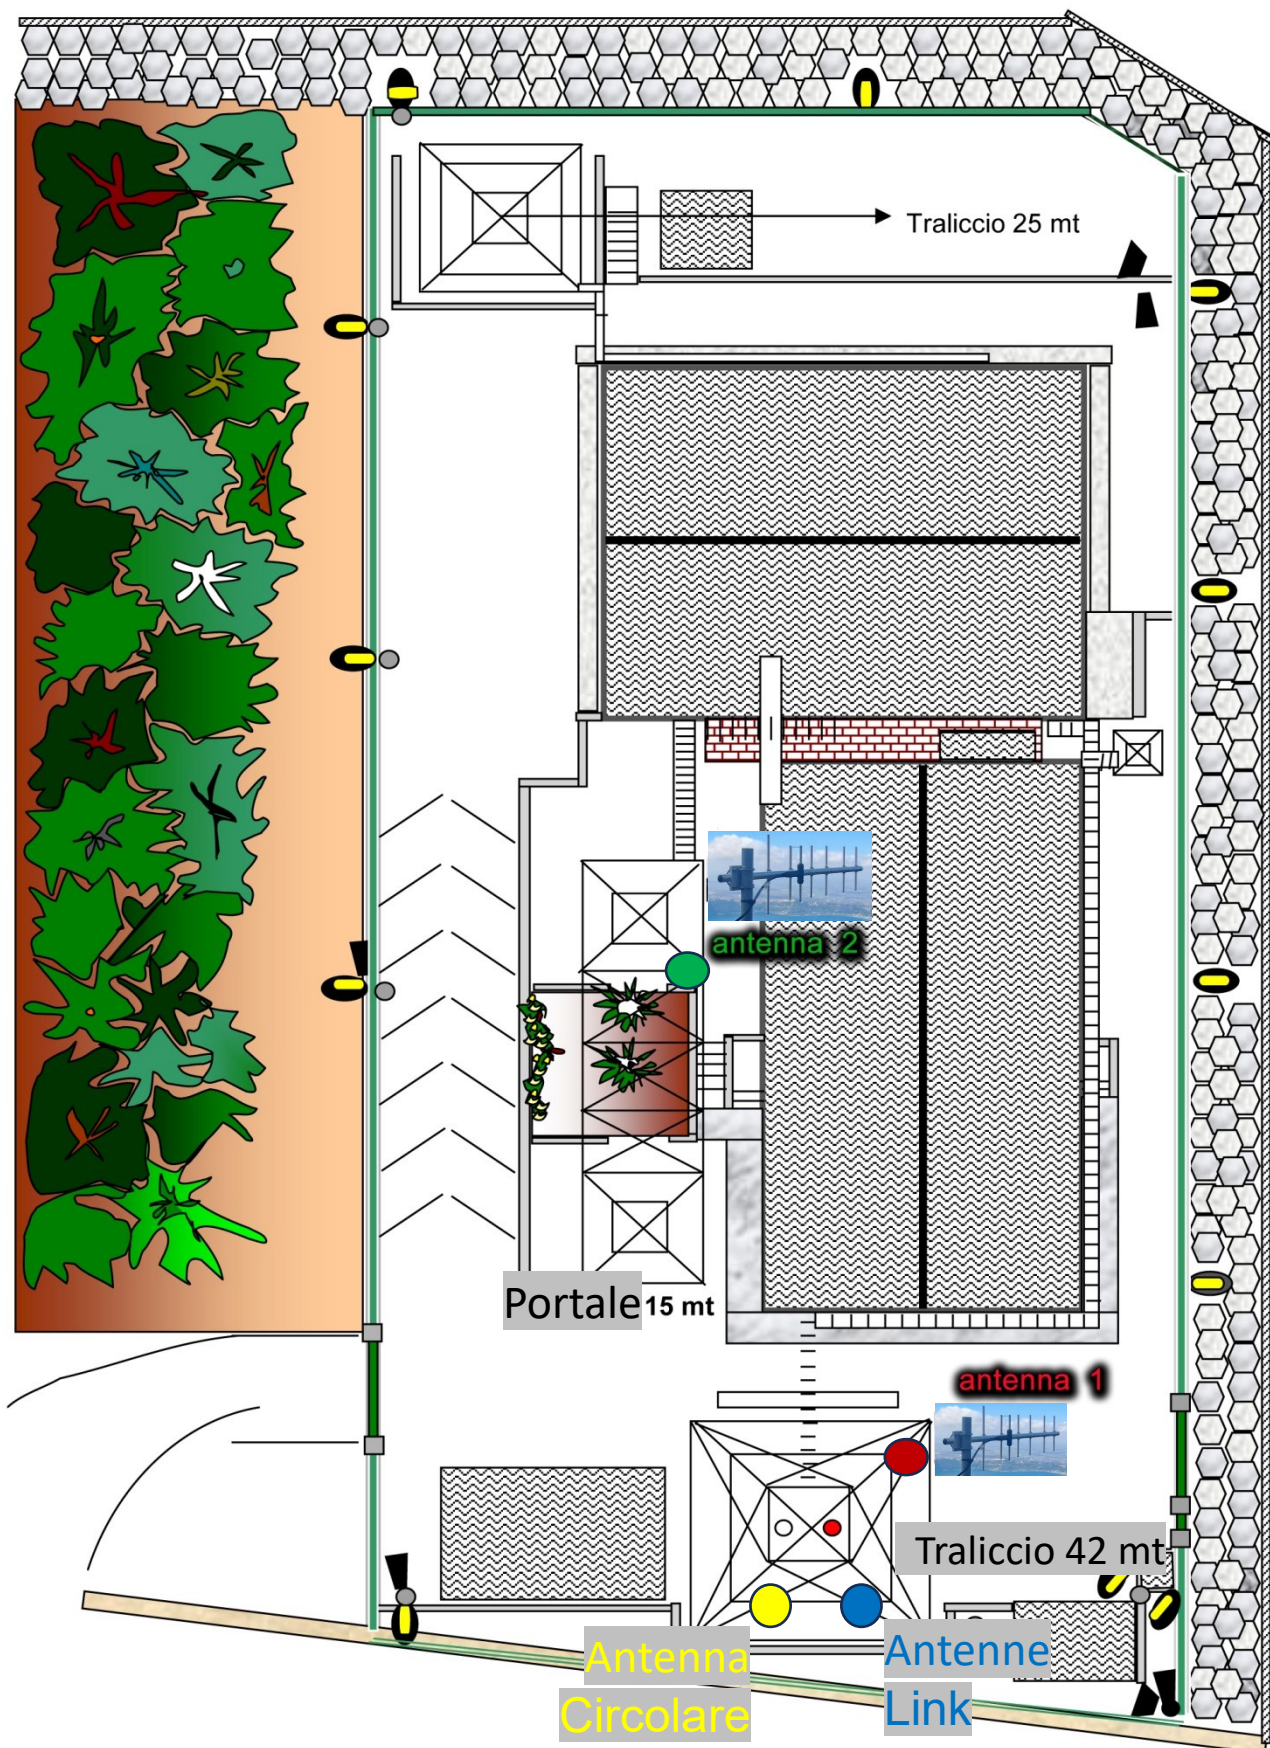




Scaricatori

Messe a terra esterne

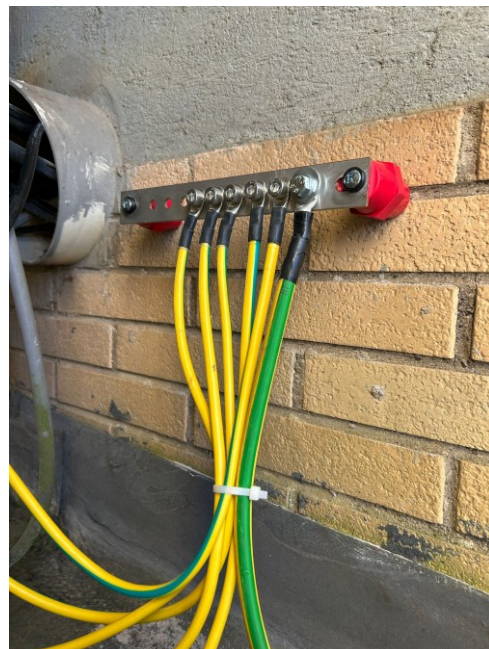

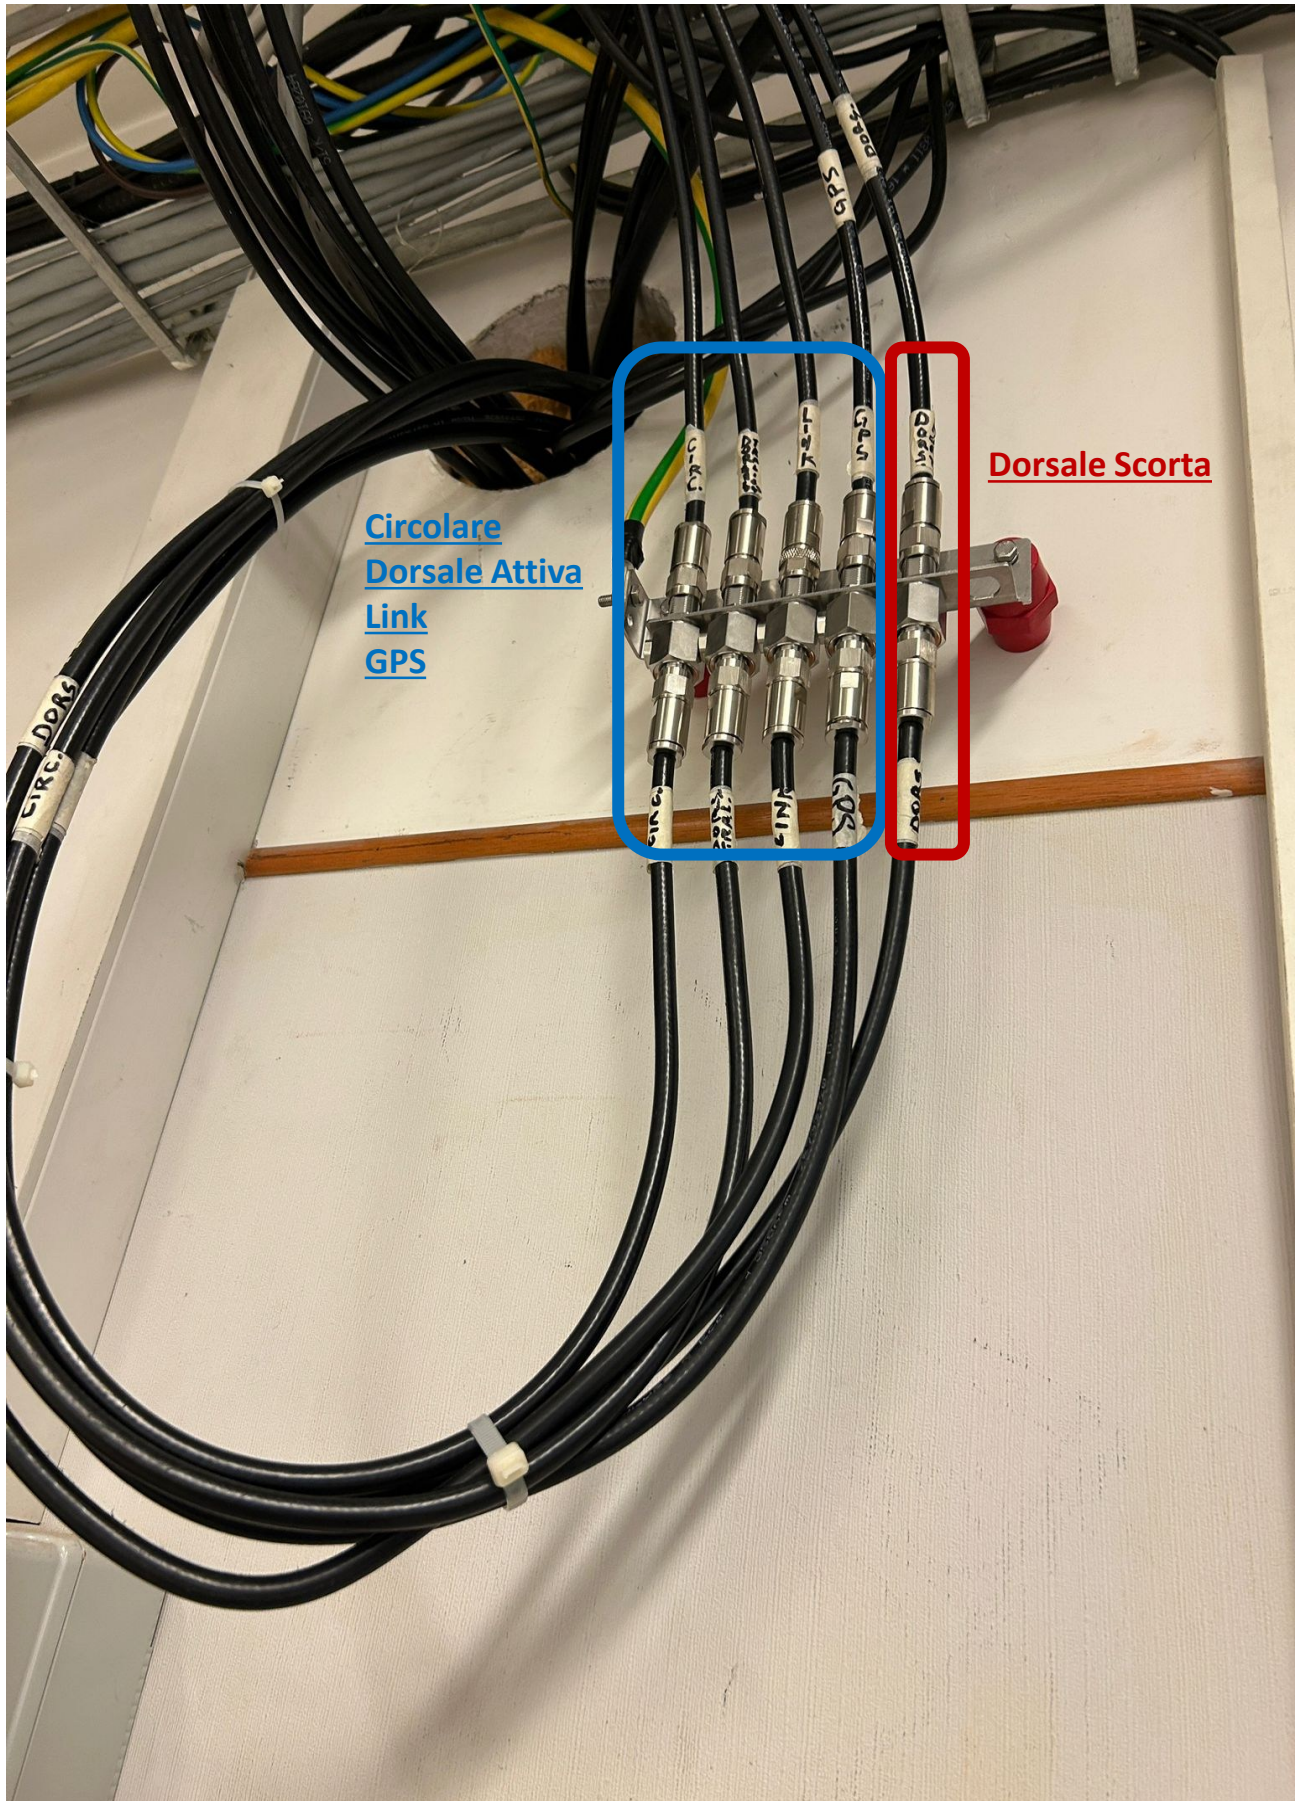

Circolare
Dorsale Attiva
Link
GPS

Dorsale Scorta

Relazione lavori Aprile 2026

Sostituzione impianti

Sezione Dorsale 1 Argentario SCORTA sostituiti Antenna e cavo

Sezione Dorsale 2 Argentario ATTIVA sostituiti Antenna e cavo

Sezione Link sostituiti Antenne, cavo e accoppiatore

Sezione Circolare sostituito cavo

Installata antenna GPS su passerella cavi vicino alle Messe a terra

Installati Messe a terra su cavi

Installati scaricatori
